

## 最終覆土工事の進捗状況について

## 1 施工理由

## ○法令等

埋立終了（H26.4.8）後は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律、公害防止協定に基づき、廃棄物の飛散・流出及び悪臭の発散を防止するため、速やかに厚さ1mの最終覆土を行わなければならない。

## ○埋立地の状況

覆土工事前の埋立地は、廃棄物の埋立を途中で終了し、異常検知箇所を深さ約10m掘削したことなどから、複数の段差（斜面）が存在するとともに、場所によっては厚さ20cmの覆土しかない所もあり、安定形状とはいえない。

こうした状態のままでは、非常に激しい雨や風などにより、覆土が流出し、廃棄物が露出・飛散する恐れがあるので、速やかに埋立エリアを厚さ1mの土砂で平らに覆う必要がある。

なお、埋め立てられていない法面部は、モルタル吹付を行うこととしている。

## 2 工事概要

- ・公告日 平成26年4月 8日
- ・入札日 平成26年4月25日
- ・契約日 平成26年4月30日
- ・工事期間 平成26年5月 1日～平成27年3月31日
- ・請負業者 峡北建設株式会社
- ・請負額 155,833,200円

## 3 工事完成図面

※P2～4 最終覆土平面図、縦断図、横断図

## 4 工事進捗状況


- 5/1～6/19 異常検知掘削箇所に廃棄物を埋戻し。
- 6/25～7/17 明野廃棄物最終処分場問題対策協議会メンバーが覆土仮置場と埋立地の間にある赤道（法定外公共物）に座り込み、トラックによる覆土の搬入を妨害したこと等により、工事が中断。
- 7/22～ 工事を再開。

※P5～7 着工前平面図、現況平面図（これまでの施工状況）  
着工前と現況（埋立地内の写真）



# 最終覆土工事 完成平面図

公告日	平成26年 4月 8日
入札日	平成26年 4月25日
契約日	平成26年 4月30日
工事期間	平成26年 5月 1日～平成27年3月31日
請負業者	峡北建設株式会社
請負額	155,833,200円

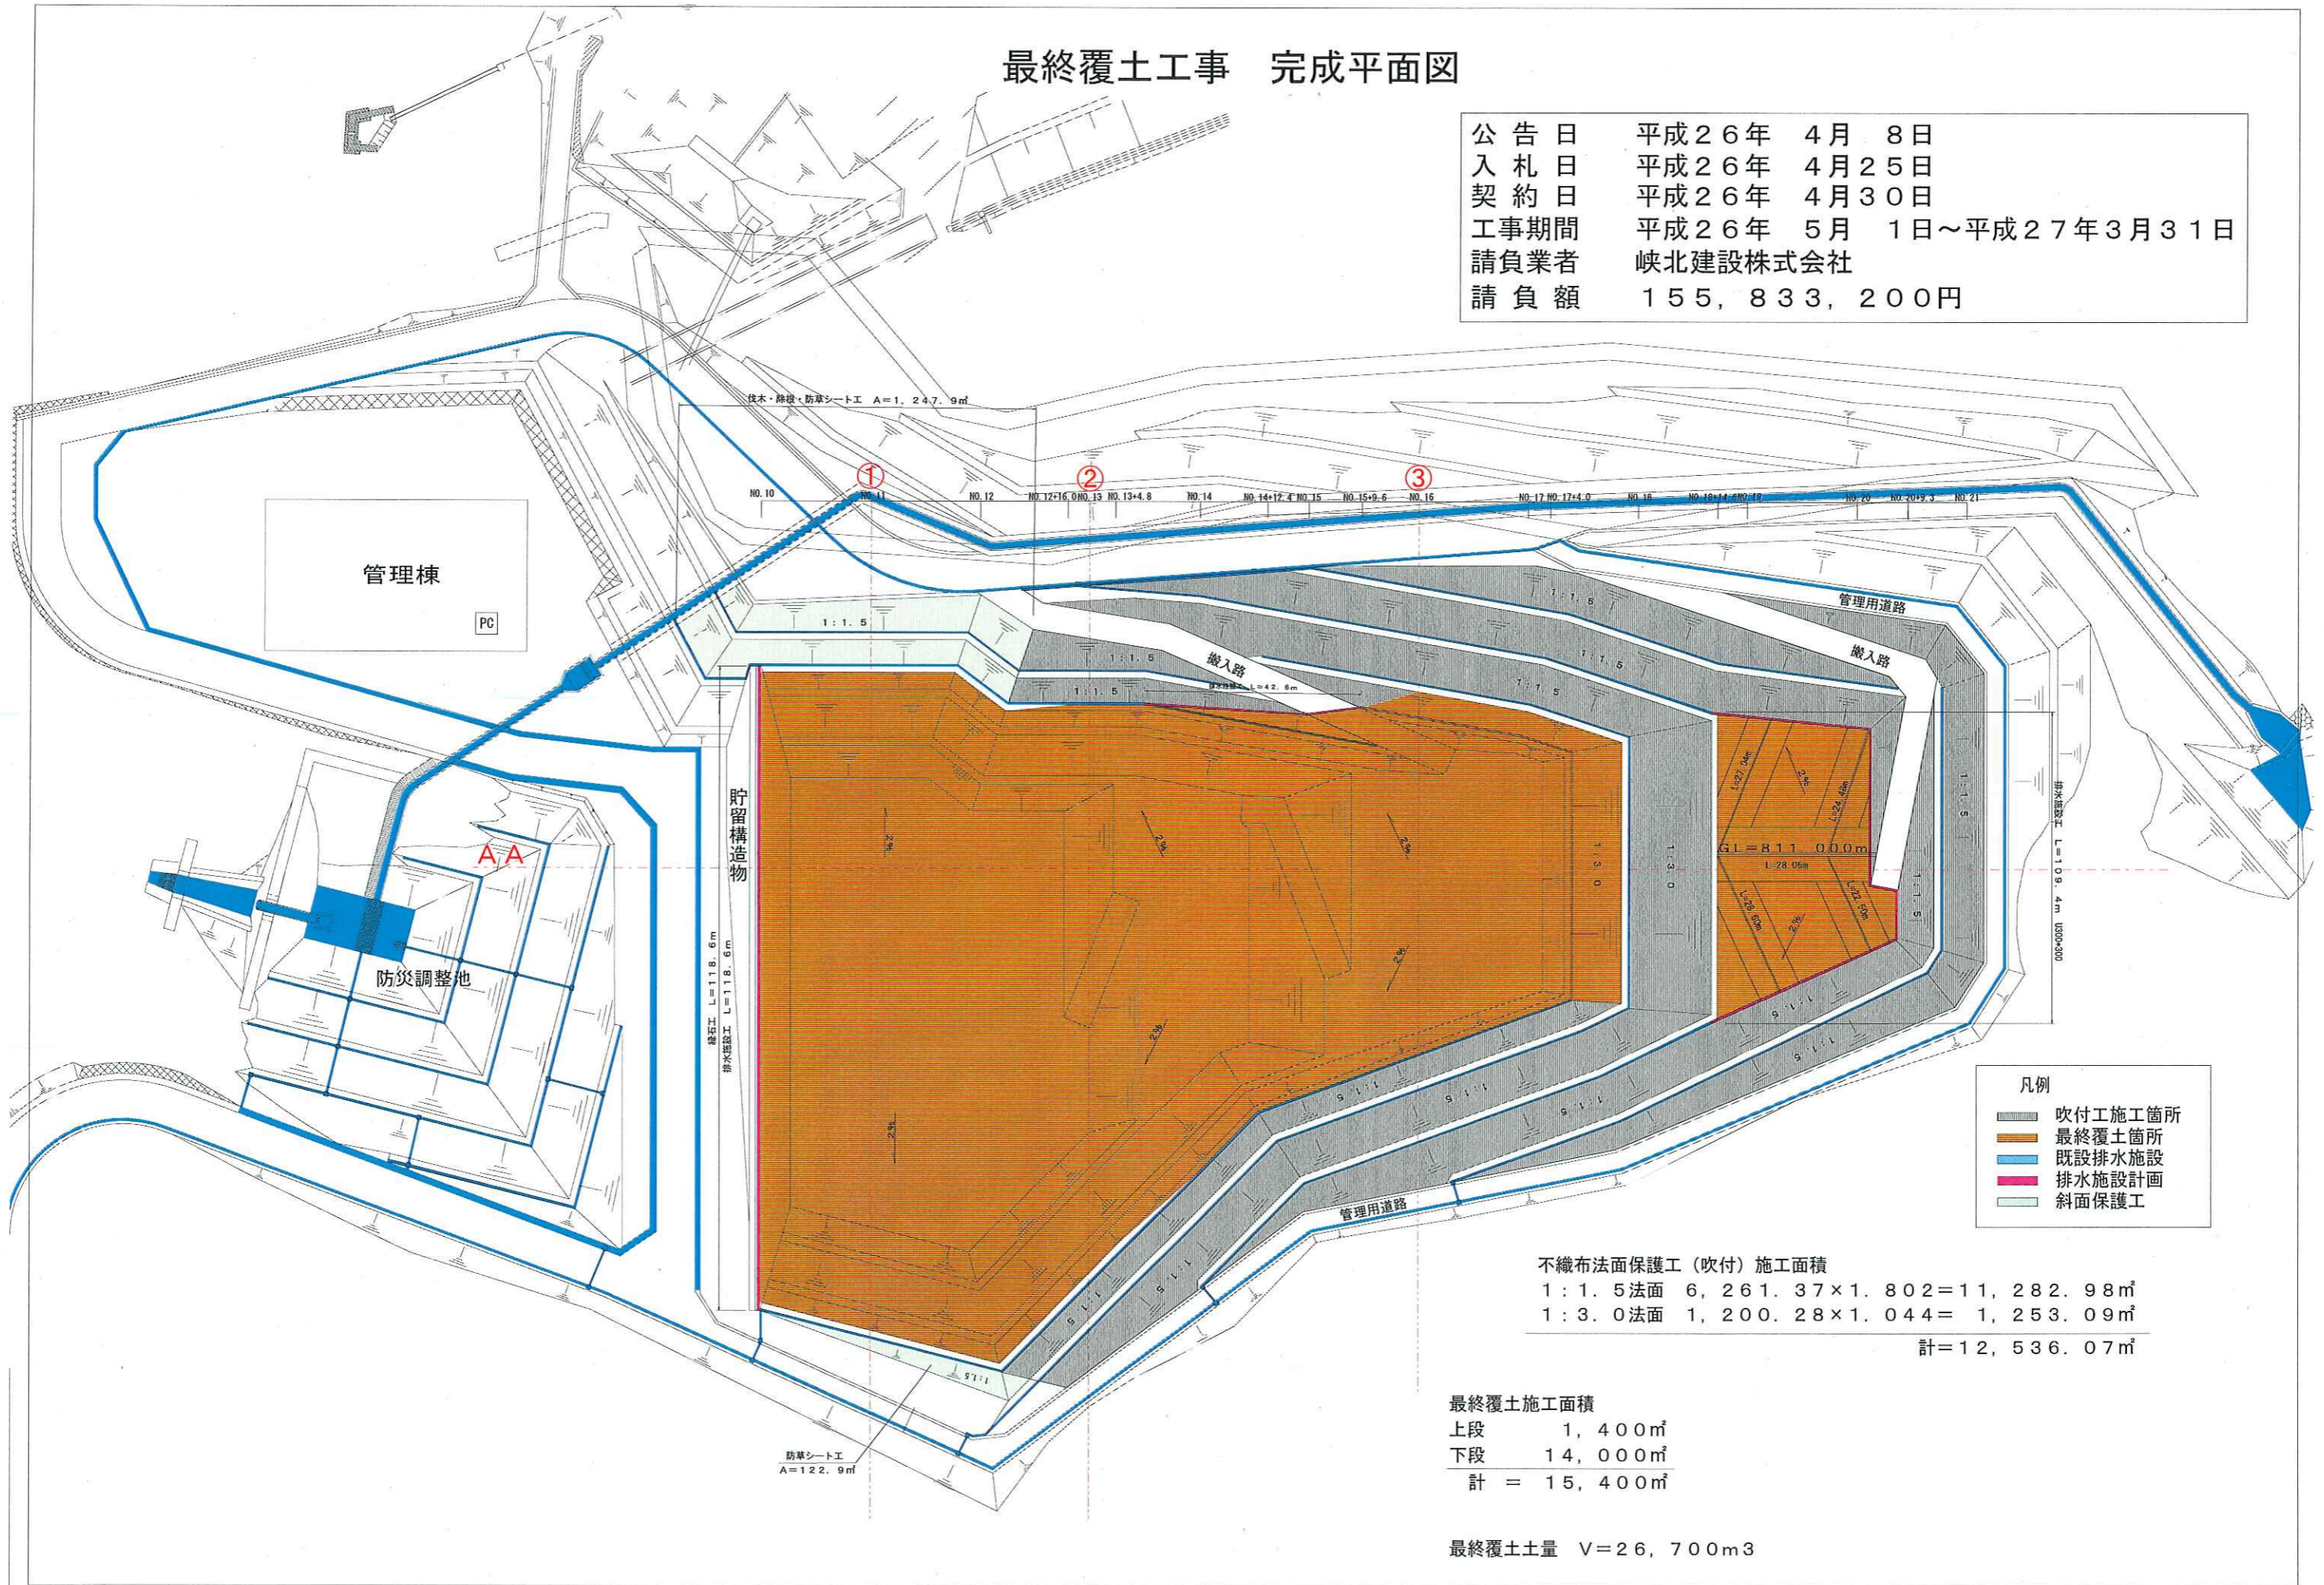

- 凡例
- 吹付工施工箇所
  - 最終覆土箇所
  - 既設排水施設
  - 排水施設計画
  - 斜面保護工

不織布法面保護工（吹付）施工面積  
 1:1.5法面  $6,261.37 \times 1.802 = 11,282.98\text{m}^2$   
 1:3.0法面  $1,200.28 \times 1.044 = 1,253.09\text{m}^2$   
 計 =  $12,536.07\text{m}^2$


最終覆土施工面積  
 上段 1,400 $\text{m}^2$   
 下段 14,000 $\text{m}^2$   
 計 = 15,400 $\text{m}^2$

最終覆土土量  $V=26,700\text{m}^3$



# 最終覆土工事 縦断面図

AA断面

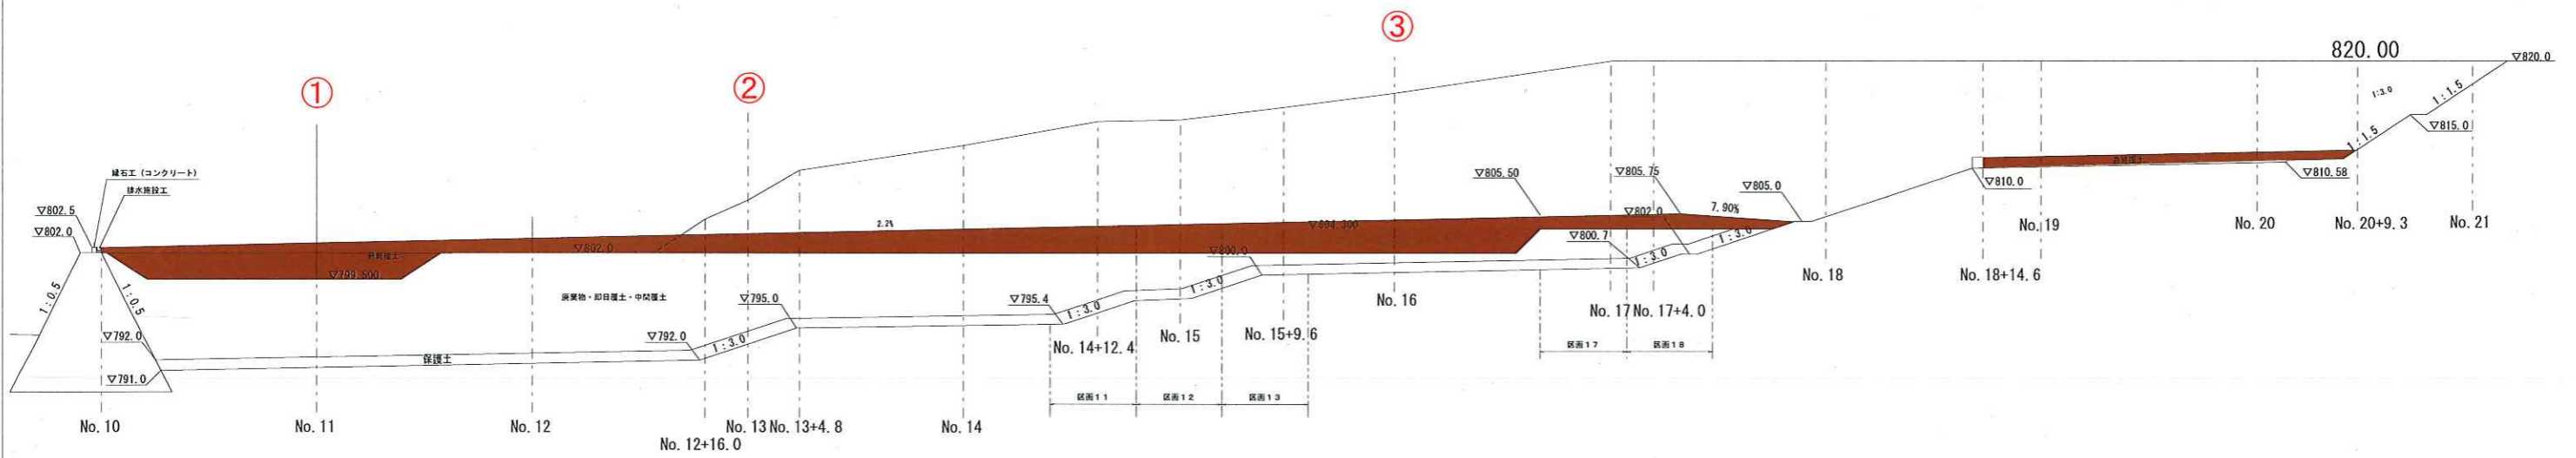

工事名	
図面名	
年月日	
尺度	図面番号
会社名	
事務所名	

# 最終覆土工事 横断面図

③

No. 16  
SH=809.56  
 FH=809.81

DL=810.00

▽805.166

モルタル吹付工

モルタル吹付工

②

No. 13  
SH=803.39  
 FH=795.12

モルタル吹付工

モルタル吹付工

DL=790.00

▽803.83

①

No. 11  
SH=799.39  
 FH=785.00

▽802.94

▽802.000

原因究明掘削箇所

DL=790.000
