


明野廃棄物最終処分場 施設配置計画平面図

資料 No. 3

平成21年1月19日現在

○面積 (ha)	
全体面積	11.2
処分場本体面積	7.8
造成面積	6.0
埋立面積	2.5
覆土仮置場	3.4

○埋立容量 (千m3)	
埋立容量	281
埋立廃棄物量	207
覆土量	74

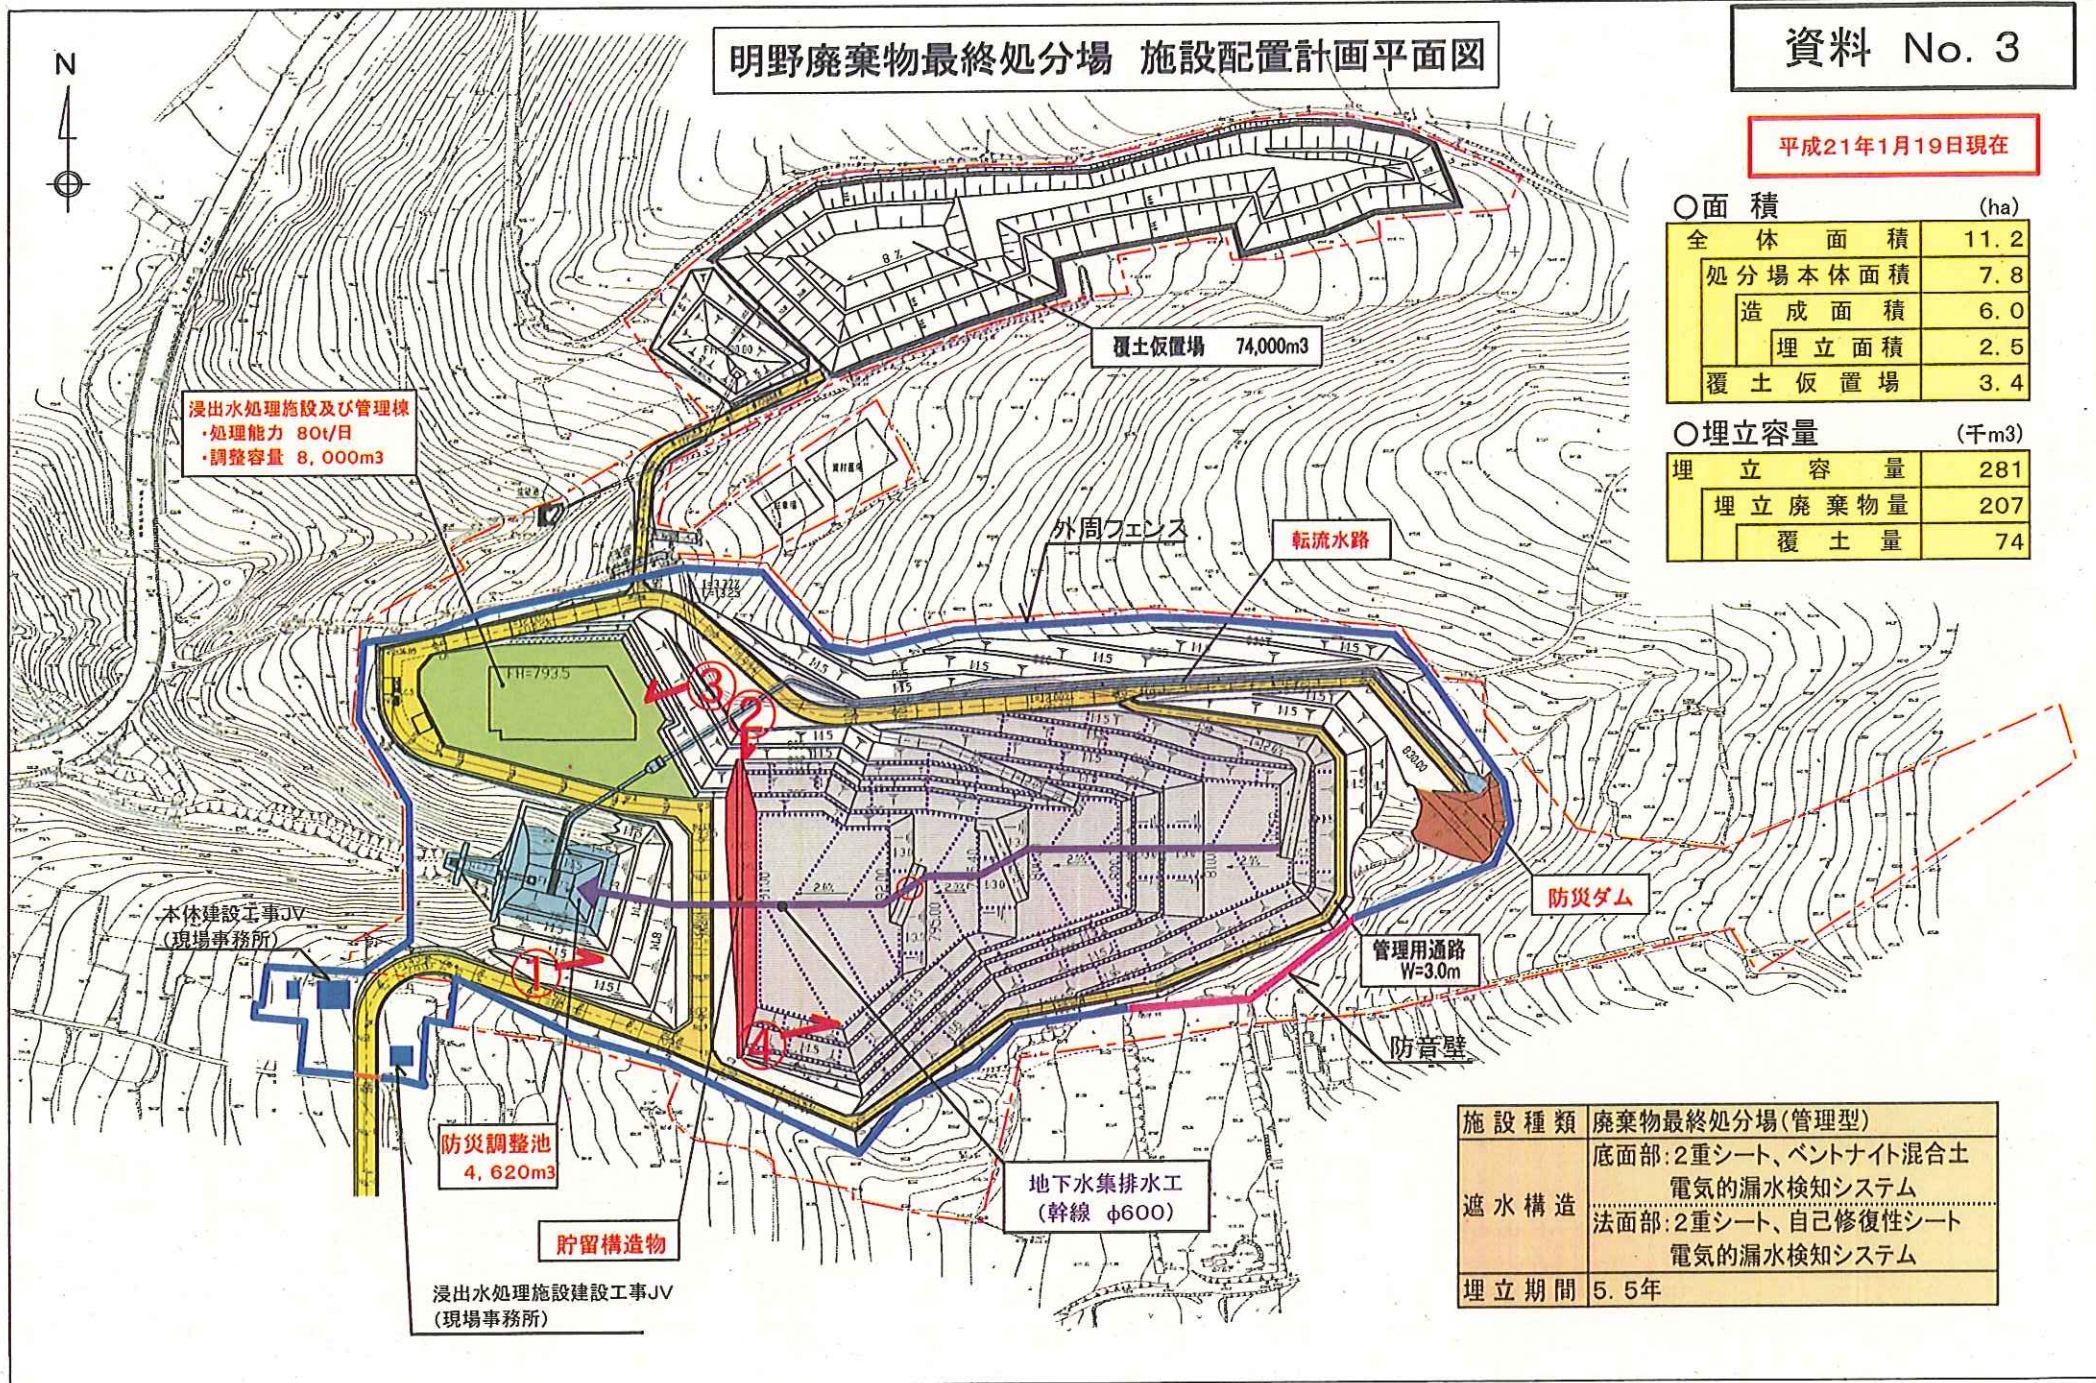

施設種類	廃棄物最終処分場(管理型)
遮水構造	底面部: 2重シート、ベントナイト混合土 電気的漏水検知システム
	法面部: 2重シート、自己修復性シート 電気的漏水検知システム
埋立期間	5.5年

進捗状況


平成21年 1月 19日現在・進捗率

工 事 名	進 捗 率
本 体 工 事	92 (%)
水 処 理 工 事	85 (%)
合 計	90 (%)

(事業費ベース)

工 事 別 進 捗 率 表

工事名	種 別	細 別	進捗率 (%)	備 考
本 体 工 事				
1	管理設備工事		62	洗車・計量・給水・電気設備等
2	貯留構造物工事		100	土工、コンクリート打設
3	遮水工事		96	ベントナイト、遮水シート、計測設備(電気検知)
4	地下水集排水工事		100	地下水集排水管(Φ=600, 200mm)、排水シート他
5	雨水集排水工事		90	防災調整池、防災ダム、転流水路、外周水路他
6	保有水等集排水設備工事		99	幹線(Φ=600mm)及び支線(Φ=200mm)集排水管
7	飛散防止工事		0	飛散防止ネットフェンス
8	赤道付替工事		0	赤道付替コンクリート舗装
9	土地造成工事		89	処分場造成(土砂掘削、運搬)、覆土置場造成
10	場内整備工事		34	管理用道路整備(舗装、ガードレール、ブロック積み)
11	門・囲障工事		79	門扉、外周フェンス、防音壁
12	残土処理場工事		100	1号処理場、2号処理場(擁壁、水路、建物撤去等)
	合 計		92	
水 処 理 施 設 工 事				
	調整槽工事		96	
	土工		100	掘削、埋戻し、残土処理
	躯体工		100	基礎工、コンクリート打設、防食塗装他
	仮設工		100	水替工
	場内整備工(外構)		22	土工、植栽工、舗装工、排水工
	建築工事		88	
	建築・本体工事		92	鉄骨・鉄筋工事、屋根・左官・内装・その他工事
	建築・電気工事		71	電力・電灯設備、監視カメラ設備、拡声設備他
	建築・設備工事		84	給排水設備、換気設備、し尿浄化槽設備他
	プラント工事		78	
	電気設備工事		76	引込受電盤、動力制御盤、現場操作盤他
	機械設備工事		78	ろ過器、オゾン発生器、滅菌器、脱水機、各種ポンプ他
	合 計		85	

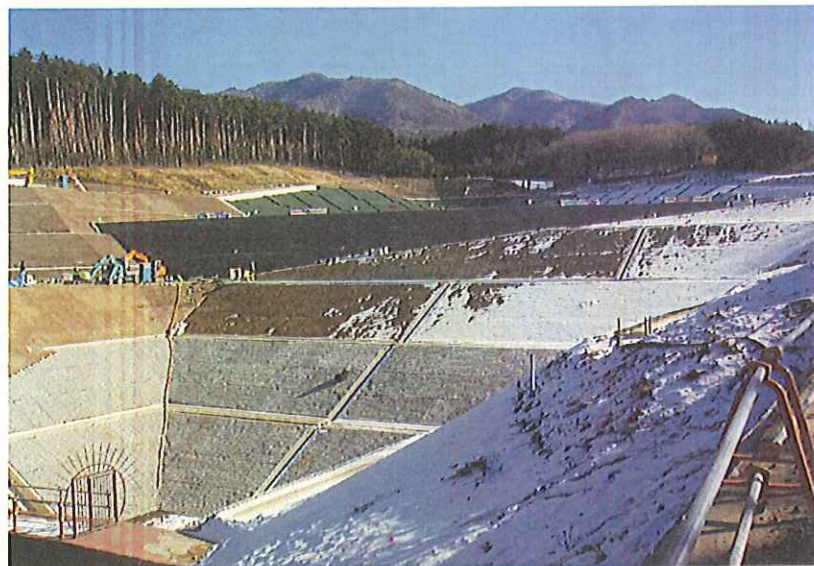

① 全景(下流より望む)



② 貯留構造物



③ 浸出水処理施設




④ 埋立予定地(下流より望む)


明野処分場航空写真(平成20年12月16日撮影)




1F平面図

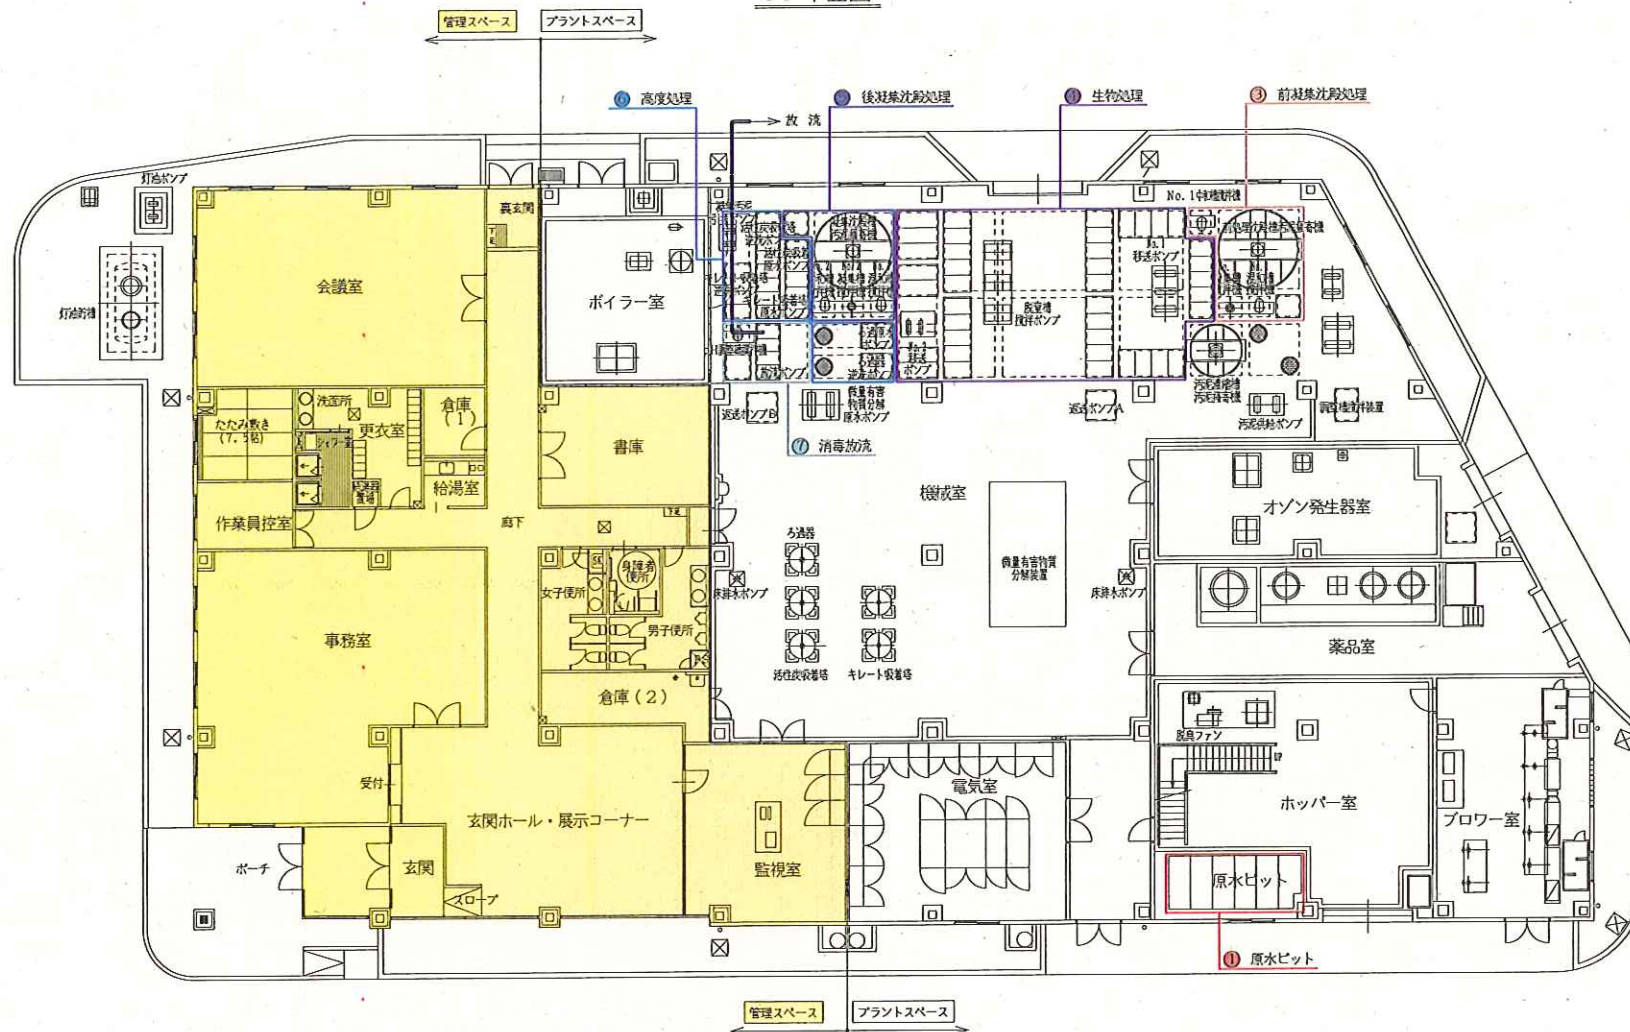

浸出水処理フロー



地下水集排水管と浸出水集排水管の概略断面図

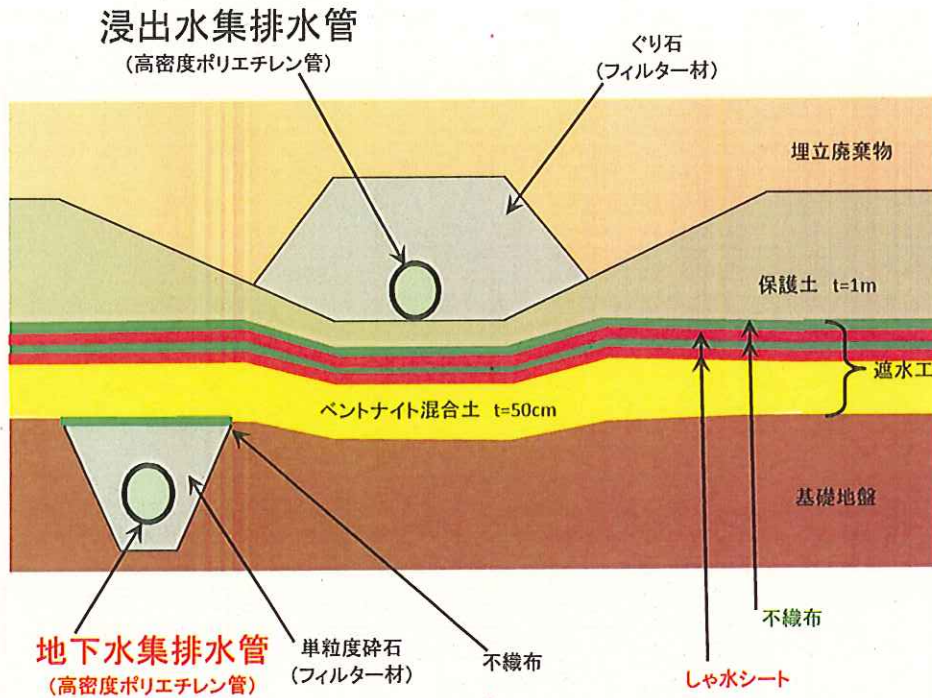

※浸出水集排水管:
埋立地内に浸入した雨水等(浸出水)を速やかに浸出水処理施設に導くための集排水管

※地下水集排水管:
遮水工下部の地下水や湧水を集水し下流に導くための集排水管

地下水集排水管の損傷箇所図

