# 作業工程表（案）

作業工程案の前提条件は以下のとおりとする。

・準備工は想定される最短の期間であり、物品調達等の状況によっては、変動することがある。
・遮水工等原因確認における作業期間は想定であり、遮水工の状態や確認方法によって期間が変動するものとする。
・先ずは遮水シート破損の可能性が考えられる地点を中心とした作業工程であり、調査範囲の拡大、必要な措置等によっては、工程の延期が必要となる。
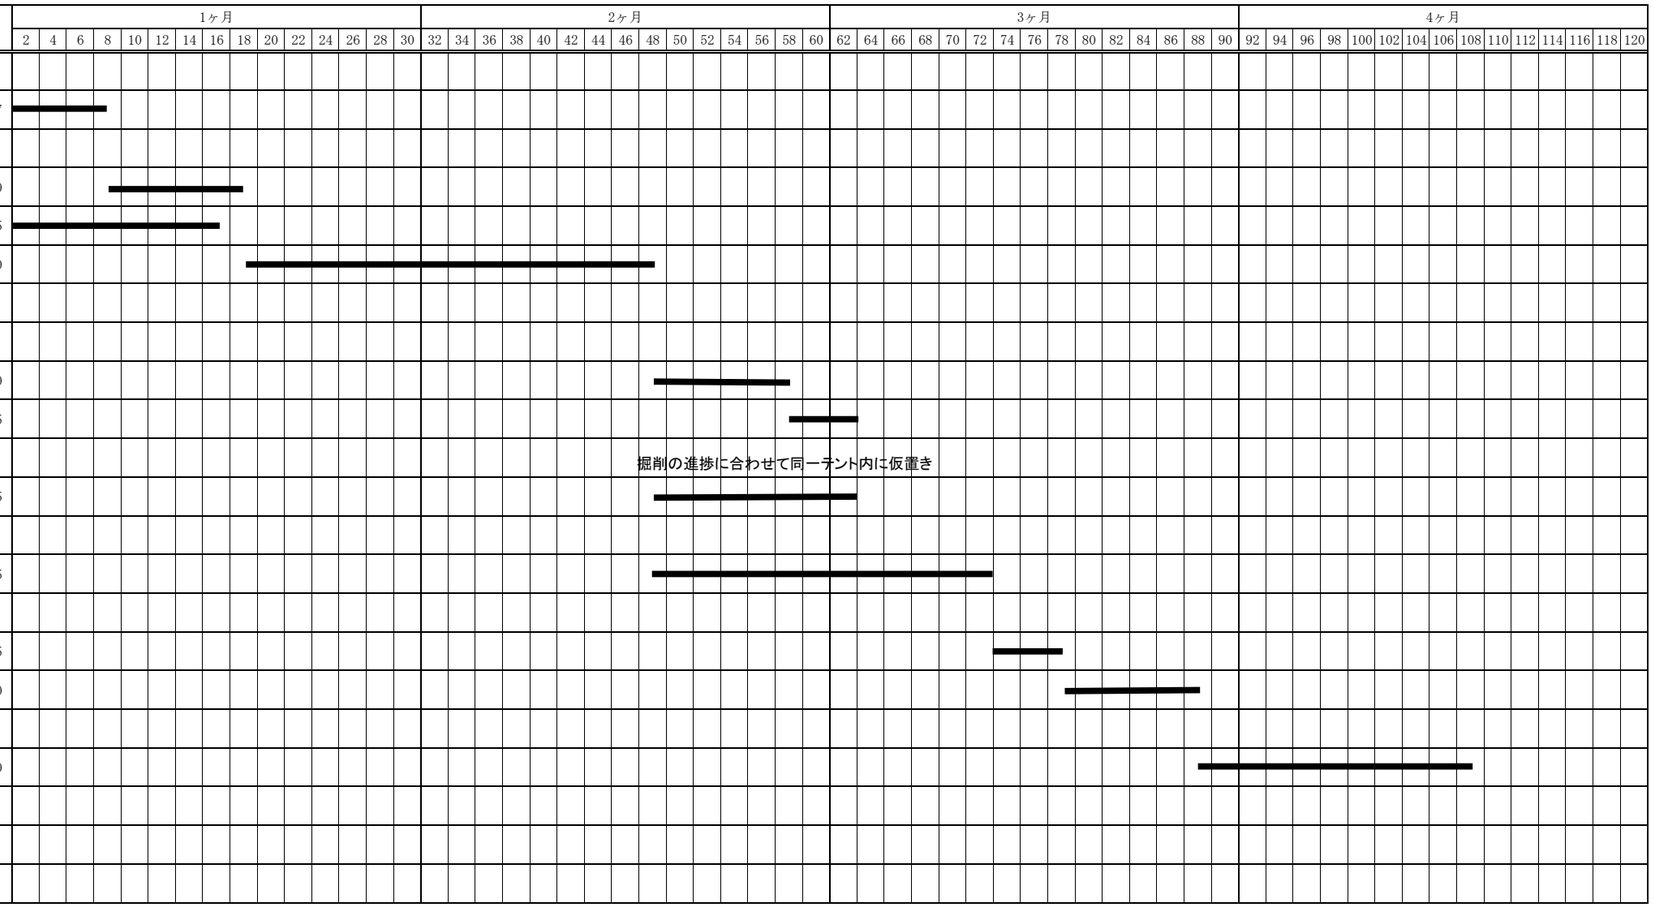
| 工種 | 種別 | 細別 | 数量単位 | 数量 | 期間日 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| 準備工 | 資機材調達<br>基礎工敷地造成 | 被覆テント<br>H鋼（山留材） | 式 | 1 | 7 |
| | | | | | |
| 仮設工 | 被覆テント基礎工 | 敷鉄板、H鋼 | 式 | 1 | 10 |
| | 被覆テント調達 | 排気ファンを含む | 式 | 1 | 15 |
| | 被覆テント設置 | | 式 | 1 | 30 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 掘削・積込み | 廃棄物層掘削除去 | 機械掘削<br>バックホウ山積0.45m3 | m3 | 610 | 10 |
| | 保護土層掘削除去 | 人力掘削 | m3 | 50 | 5 |
| | | | | | |
| 運搬・仮置き | 掘削物テント内仮置き | 機械掘削<br>バックホウ山積0.45m3 | m3 | 660 | 15 |
| | | | | | |
| 遮水工等原因確認 | | | 式 | 1 | 25 |
| | | | | | |
| 埋め戻し | 保護土層埋戻 | 人力埋戻 | m3 | 50 | 5 |
| | 廃棄物層埋戻 | 機械埋戻<br>バックホウ山積0.45m3 | m3 | 610 | 10 |
| | | | | | |
| 片づけ | 被覆テント撤去含む | | 式 | 1 | 20 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
